



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ , ผลการออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการออกสอดส่องโครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบคัดเลือกเพื่อออกสอดส่องฯ โดยรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการออกสอดส่องโครงการ และรูปภาพการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง และที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงด้วยดีมาโดยตลอด คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่าน หากมีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ๑ - ๒
- ส่วนที่ ๒ องค์กรประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ๓
- ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
 - ๓.๑ ผลการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ๔ - ๖
 - ๓.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗ - ๑๒
 - ๓.๓ ผลการสอดส่องโครงการสำคัญในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามซ้ำ) ๑๓
 - ๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๔ - ๒๔
 - ๓) โครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕ - ๓๖
 - ๔) โครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณพนธ์ บุญแก้ว) ๓๗
- ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม ๓๘
- ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก ๓๙

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาล



ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
- ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
- ๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

มาตรา ๕๓/๒ ให้นำความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม

๑.๓ จากมาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๕๓/๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ต่อมาได้ถูกนำไปกำหนดใช้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จำนวนวิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีที่เป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จากมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ ขยายความมาตรา ๕๕/๑ ววรรคแรก ที่ว่าการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ นั้น มาตรา ๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

๑.๖ จากมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกล่าว ไว้ในข้อ ๑.๕ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๗ จากที่ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒ ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภูมิภาค ซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนกับมาตรา ๕๕/๑ ในเรื่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และยังเสริมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้วย ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และในความสอดคล้องของมาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑ ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จึงกำหนดบทบาทเพื่อการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ส่วนที่ ๒

องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพัทลุง



ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

นายนพพร บุญแก้ว
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

นางกาญจนา ผอมดำ
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

นายธิตติ สิทธิศักดิ์
(ที่ปรึกษาด้านวิชาการ)

นายสุธรรม คงเพชร
(ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์)

นายประพิศ คงหนู
(ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ)

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

นายชวณ หนูเอียด
ผู้แทนอำเภอควนขนุน

นายจบ แก้วทิพย์
ผู้แทนอำเภอเขาชัยสน

นายประเดิมชัย จิตคงสง
ผู้แทนอำเภอป่าพะยอม

นางสาวพรพิศ พลเพชร
ผู้แทนอำเภอตะโหมด

นายก่อหลัด บุญมี
ผู้แทนอำเภอกงหรา

นายสมพงษ์ เขียวหอม
ผู้แทนอำเภอป่าบอน

นายสมปอง เทพสุริวงค์
ผู้แทนอำเภอปากพะยูน

นางนิชาภา คงรักษ์
ผู้แทนอำเภอเมืองพัทลุง

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

นายวิรัตน์ คงแก้ว
(ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

นายสายัญ แดงปรก
(ผู้แทนเทศบาล)

นายเฉลียว เทอดวีระพงศ์
(ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล)

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

นายเคนทร์ หนูฤทธิ

นายปรีชา อภัยยานุกร

นางภัคจิรา เณรพิง

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวจินตกาญจน์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดพัทลุง

นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพัทลุง



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง



๓.๑ ผลการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

☛ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง อย่างเป็นทางการ (สามัญ) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

☛ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง อย่างไม่เป็นทางการ (วิสามัญ) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

☛ การลงพื้นที่ออกสอดส่องการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓ ครั้ง ดังนี้

- ๑) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๒) วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๓) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๔) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓ โครงการ)
- ๕) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ โครงการ)
- ๖) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /
โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๗) วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๘) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๙) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓ โครงการ)
- ๑๐) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๑๑) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๑๒) วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ติดตามซ้ำ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)
- ๑๓) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ➢ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ โครงการ)

การประชุมอย่างเป็นทางการ (สามัญ)



ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

สาระสำคัญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการ / รับทราบและพิจารณาผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลการออกสวดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

สาระสำคัญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการ / รับทราบและพิจารณาผลการออกสวดส่องโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมอย่างเป็นทางการ (วิสามัญ)



ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สาระสำคัญ : พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะออกสอส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเบื้องต้น และหารือแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ก่อนการออกสอส่งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง/โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

สาระสำคัญ : พิจารณาสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามซ้ำ) / ผลการออกสอส่งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ



ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

สาระสำคัญ : พิจารณาสรุปผลการติดตามโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๓.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ งบประมาณรวม ๒๐๖,๒๔๓,๐๐๐ บาท / โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ งบประมาณรวม ๖๖๖,๙๕๔,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณรวม ๒๐๖,๒๔๓,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น			
๑	ยกระดับการผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๓,๘๖๖,๙๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
๒	เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ปลอดภัย	๗,๓๙๕,๙๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
๓	ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุตสาหกรรม การเกษตร	๑,๒๒๓,๔๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
๔	พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล	๓๕๓,๓๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
๕	การเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดด้วยการแปรรูป ข้าวสังข์หยดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	๘๔๙,๒๐๐	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว	๗,๓๕๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
รวม ๖ โครงการ		๒๑,๐๓๘,๗๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน			
๑	พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง	๔,๐๕๔,๐๐๐	อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
๒	ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบต่อฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung Go Green Festival)	๙๔๖,๗๐๐	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
๓	มหกรรมเมืองลุงเท่ ครั้งที่ ๒ (Phatthalung Festival)	๑,๖๕๐,๐๐๐	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
๔	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
รวม ๔ โครงการ		๗,๕๕๐,๗๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน			
๑	คนเมืองลุง คนคุณภาพ	๔,๔๒๑,๙๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
๒	เสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม	๖,๗๐๖,๘๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
รวม ๒ โครงการ		๑๑,๑๒๘,๗๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน			
๑	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานพัทลุง
๒	เขาวงกตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง	๔๙๒,๔๐๐	อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า/วนอุทยาน
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก	๘๐๒,๕๐๐	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
๔	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
รวม ๔ โครงการ		๕๑,๒๙๕,๙๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่			
๑	เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๒	เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท	๔๐,๒๓๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
รวม ๒ โครงการ		๑๑๕,๒๓๐,๐๐๐	
รวมทั้ง ๕ ประเด็น จำนวน ๑๘ โครงการ		๒๐๖,๒๕๓,๐๐๐	

๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๙ โครงการ งบประมาณรวม ๖๖๖,๙๕๔,๗๐๐บาท ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ
๑	รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	๖๒	๒๙๕,๒๘๓,๐๐๐
๒	รายการเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	๑๘	๘๐,๗๐๗,๙๐๐
๓	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	๒,๔๓๒,๐๐๐
๔	รายการค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	๗	๑๖,๘๔๖,๑๐๐
๕	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๓๔	๒๒๕,๖๑๐,๖๐๐
๖	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	๖	๑๐,๗๐๐,๐๐๐
๗	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเล็ก	๑	๗,๙๕๙,๙๐๐
๘	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕	๑๒,๑๙๗,๘๐๐
๙	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	๑	๑๗๐,๐๐๐
๑๐	รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑	๑๔,๖๓๖,๐๐๐
๑๑	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒	๔๔๑,๔๐๐
รวม		๑๕๙	๖๖๖,๙๕๔,๗๐๐

ในการทวการประชุมคณะกรรมการธรรมาภบาลจังหวดพัทลุง (ก.ธ.จ.พัทลุง) นอกรอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมอวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ด้เห็นชอบให้คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวดพัทลุง และโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่จะดำเนินการสอดส่องในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง
๒. เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
๓. เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

และที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภบาลจังหวดพัทลุง ด้มีมติคัดเลือกแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามซ้ำ) จำนวน ๑ โครงการ
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ
๓. โครงการที่ด้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ

➤ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ◀

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามซ้ำ) จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดพัทลุง

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวดพัทลุง	๔,๐๕๔,๐๐๐	อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Phatthalung Go Green Festival)	๙๔๖,๗๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดพัทลุง
๓	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานพัทลุง
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน	๗๕๐๐๐๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย	๗,๓๙๕,๙๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวดพัทลุง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖	โครงการเสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม	๖,๗๐๖,๘๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปะอาชีพบ้านหัวป่าเขียว	๗,๓๕๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
๘	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท	๔๐,๒๓๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัดสวนไผ่ขวัญใจ และตลาดนัดควนขนุนสยาม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวพรุ - ยางแค เชื่อมโยงไปยังตลาดสวนไผ่ขวัญใจ และตลาดควนขนุนสยาม	๙,๘๗๒,๐๐๐	เทศบาลตำบลหนองพ้อ อ.ควนขนุน
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว ชุมชนในไร่พัฒนา ๒ ชุมชนบ้านพักครู ชุมชนสุขศาลาพัฒนา ชุมชนผดุงธรรมและชุมชนหลังสถานีรถไฟบางแก้ว ตำบลท่ามะเตี้อและตำบลโคกสัก	๑,๖๘๔,๒๐๐	เทศบาลตำบลท่ามะเตี้อ อ.บางแก้ว
๓	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน	๒,๙๖๓,๙๐๐	เทศบาลตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน
๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำพญาไธ้ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งเสากิ่งเดียวตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๕๕ ชุด	๓,๘๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตบอล บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓	๓,๒๕๓,๐๐๐	เทศบาลตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาสายเลียบคันคลองแหลมโตนด (ด้านขวา)โดยก่อสร้างเส้นทางจักรยาน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง	๘,๙๘๔,๐๐๐	เทศบาลตำบลแหลมโตนด อ.ควนขนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.- สายโหล๊ะมุดสัง - ไสขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร	๖,๖๐๑,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพะยอม
๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานยาง - ปลายห้วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๐ ตารางเมตร	๘,๔๖๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต
๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	๔,๔๑๘,๖๐๐	เทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด
๑๐	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบเมืองเก่าชัยบุรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๓,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๒๒๐ ตารางเมตร	๘,๐๕๔,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง
๑๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ต้นกรอสส์ และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔.๖๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๗,๘๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป-เต่าถ่าน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๓๑๐๐๓ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายตำบลหนองธง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๔๑๐ ตารางเมตร	๖,๐๗๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลป่าบอน อ.ป่าบอน



๓.๓ ผลการสอดส่องโครงการสำคัญในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามซ้ำ)

(๑.๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำป่า

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๑๙,๙๙๒,๐๐๐ บาท
 (เริ่มต้นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ / สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕)
 เงินเหลือจ่าย ๘,๐๐๐ บาท
 รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

โครงการนี้เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่ออกสอดส่องโครงการนี้แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19 (ติดเชื้อ ๒ รอบ) รวมทั้งประสบปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกตลอดทั้งปี ทำให้การดำเนินงานล่าช้า โครงการนี้สิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ หน่วยงานจึงได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี และได้ดำเนินโครงการต่อจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้ชำรุด ทรุดโทรม ไปตามระยะเวลาและการใช้งาน เช่น ลานอเนกประสงค์/ ลานกิจกรรมทั่วไป/ปรับปรุงศาลาเดิม/งานระบบสุขาภิบาล/ทางเดิน/ม้านั่ง/ทางเดินริมเขื่อน/ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และปรับระดับพื้นที่ให้มีระดับพื้นเท่ากัน โดยมีการยกเขื่อนให้สูงขึ้น ประมาณ ๒๐% (เขื่อนเดิมมีการทรุดเนื่องจากกรวดของน้ำ) ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่พักผ่อน รวมทั้งสามารถดึงดูดประชาชน/นักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมากขึ้น

☞ โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☜

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ส่งมอบงานตามแผนงาน (ผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละรอบที่แล้วเสร็จ)



๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒.๑) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	๔,๐๕๔,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๔,๐๕๒,๕๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๑,๕๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า

อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างลานจอดรถ บ้านพัก ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และก่อสร้างลานกิจกรรมแคมป์ไฟและลานกางเต็นท์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการรองรับเยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการในพื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั่วไป

☞ โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ในขณะที่เริ่มต้นโครงการ ในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
- ๒) ในบางช่วงของการดำเนินงาน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นระยะ ทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินงาน
- ๓) พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า มีต้นไม้จำนวนมาก ทำให้การเข้าปรับพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต้นไม้เดิมที่อยู่ในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานในบางส่วนต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น



(๒.๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung Go Green Festival)

งบประมาณ	๙๔๖,๗๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๙๔๖,๗๐๐ บาท
เงินเหลือจ่าย	- บาท
รับผิดชอบโดย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

● แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ●

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ๑.๑ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ความรู้ และเครือข่าย
- ๑.๒ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
- ๑.๓ กิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบจังหวัดพัทลุง
 - เทศกาลล่องแก่งป่าพะยอมและเทศกาลเดินเขาคืนกล้า สร้างป่าเมืองลุง (เขา)
 - เทศกาลศิลปะผืนนาเมืองลุง และเทศกาลกินข้าวใหม่เมืองลุง (นา)
 - เทศกาลกึ่งสามน้ำ กินร้อย ปล่อยล้น และเทศกาลสร้างบ้านปลาบั้งริมเล เเท่เมืองลุง (เล)
 - เทศกาลทุเรียนเมืองลุงและเทศกาลแคมป์ปิ้ง (ป่า)

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

กิจกรรมที่ ๒ จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเมืองลุง เขา ป่า นา เล

- ดำเนินจัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเมืองลุง เขา ป่า นา เล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -



(๒.๓) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ

งบประมาณ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๙,๙๕๙,๕๘๘ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๔๐,๔๑๒ บาท
รับผิดชอบโดย	โครงการชลประทานพัทลุง

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยขจัดปัญหาความแห้งแล้ง/แก้ไขปัญหาคูทกภัยให้กับประชาชนหมู่ที่ ๑,๔ ต.พญาขัน ซึ่งเดิมโครงการชลประทานพัทลุงเป็นผู้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค (มีการประมาณการค่าสาธารณูปโภคประจำปีเฉลี่ยอยู่ที่ ๓ - ๔ หมื่นบาท/ปี) และมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อช่วยบริหารจัดการการใช้น้ำของประชาชน (มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดน้ำ) แต่เนื่องจากเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปรากฏว่ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรหมู่ที่ ๒ เกษตรกรในพื้นที่จึงได้ร้องขอให้มีการขยายความยาวท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรอีก ๓๕๐ ไร่ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้มีประสิทธิภาพ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะโอนให้เทศบาลตำบลพญาขันเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยค่าสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งทางเทศบาล จะตั้งของบประมาณ และอีกส่วนหนึ่งจะเรียกเก็บจากประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการขุดดินพร้อมวางท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร พร้อมถมทราย ถมดินกลบ ต่อท่อจ่ายน้ำเข้านา และซ่อมแซมทางลำเลียงแล้วเสร็จ

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว☜

ปัญหา/อุปสรรค

- สภาพฝนฟ้าอากาศที่มีฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ทำให้เป็นอุปสรรคในการขุดดิน เพื่อวางท่อ PVC



(๒.๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน

งบประมาณ	๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๗๒,๖๙๘,๘๘๕.๐๘ บาท
เงินเหลือจ่าย	๒,๓๐๑,๑๑๔.๙๒ บาท
รับผิดชอบโดย	แขวงทางหลวงพัทลุง

● แบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ●

๑) กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๒๘,๒๙๙,๕๕๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

- โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการก่อสร้างขยายผิวจราจร โดยเพิ่มมาตรฐานทางจากเดิมจากมาตรฐานทาง ชั้น ๔ เป็นชั้น ๑ ผิวจราจร กว้าง ๗ เมตรไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและประชาชนทั้งสองข้างทาง

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

๒) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS , CUT OFF งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๙,๙๗๔,๗๐๕ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ป่าบอนเหนือ - โหล๊ะจังกระ , ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา (เป็นตอนๆ) เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวเรียบร้อยแล้ว

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

๓) กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๔๐๑๘ ตอน ไม้เสียบ -หัวถนน โดยการขยายความกว้างของผิวจราจร และผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. จากมาตรฐานทางชั้น ๔ (๗/๙) เป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ (๗/๑๒) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๒๔,๔๒๖,๗๐๐.๐๘ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗)

- ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพื้นที่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม โดยการขยายความกว้างของผิวจราจร และผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร จากมาตรฐาน ทางชั้น ๔ (๗/๙) เป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ (๗/๑๒) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและประชาชนทั้งสองข้างทาง
ผลงานการก่อสร้าง ณ ปัจจุบันประมาณ ๓ % (งานเคลียร์ปรับพื้นที่ทาง ๒ ข้างถนน) **กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปีแล้ว

☞ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☞

๔) กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM.TYPE I บนทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๒ ตอน พัทลุง -นาโหนด (เป็นตอนๆ) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๙,๙๙๗,๙๓๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ / ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)

- ติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๒ ตอน พัทลุง - นาโหนด (เป็นตอนๆ) เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงเส้นทาง

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค (ภาพรวมทั้ง ๔ กิจกรรม)

- ๑) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวดงาน และมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า

กิจกรรมโครงการที่ ๑



กิจกรรมโครงการที่ ๒



กิจกรรมโครงการที่ ๔



(๒.๕) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

งบประมาณ	๗,๓๙๕,๙๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๗,๓๙๕,๙๐๐ บาท
เงินเหลือจ่าย	- บาท
รับผิดชอบโดย	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

● แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ●

กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับศูนย์เรียนรู้

๑.๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานแนวเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๙๙๐ คน (อำเภอละ ๙๐ คน) จำนวน ๓๓ รุ่น โดยจัดการอบรมเป็นแบบหลักสูตร ๔ วัน แบ่งเป็นทฤษฎี ๒ วัน และปฏิบัติ ๒ วัน

๑.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนายกระดับสู่ Smart Farmer เพื่อเป็น Intensive Farm จำนวน ๑๐๐ คน (อำเภอละ ๑๐ ฟาร์ม)

๑.๓ พัฒนายกระดับศักยภาพแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์จัดการเศรษฐกิจจากฐานปศุสัตว์แบบครบวงจร อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๑๑ ศูนย์ โดยการซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในแหล่งเรียนรู้

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาด้านการตลาด

๒.๑ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน หลักสูตร ๒ วัน

๒.๒ จัดฝึกอบรมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ทุกรูปแบบและตลาด online (Market Place) จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน หลักสูตร ๑ วัน

๒.๓ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดปศุสัตว์ จำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน หลักสูตร ๑ วัน

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า

กิจกรรมที่ ๑.๑

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน



กิจกรรมที่ ๒.๑

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์



กิจกรรมที่ ๑.๒

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนายกระดับสู่ Smart Farmer



กิจกรรมที่ ๒.๒

ฝึกอบรมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ทุกรูปแบบและตลาด online (Market Place)



(๒.๖) โครงการเสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม

งบประมาณ	๖,๗๐๖,๘๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๖,๗๐๖,๘๐๐ บาท
เงินเหลือจ่าย	- บาท
รับผิดชอบโดย	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

● แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ●

กิจกรรมที่ ๑ เสริมพลังเครือข่าย พม.จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

รับผิดชอบโดย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง

๑.๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๓ รุ่น กลุ่มเป้าหมาย ๓๗๐ คน (๒ วัน ๑ คืน) จำนวน ๓ รุ่น

๑.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

- จัดอบรมฝึกอาชีพเครือข่ายพื้นที่ปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ พื้นที่ๆ ละ ๑ หลักสูตรๆ ละ ๕๐ คน

๑.๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มเปราะบาง

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒๒ ครัวเรือน

☞ **กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว** ☞

กิจกรรมที่ ๒ TO BE NUMBER ONE พัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รับผิดชอบโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

- ส่งทีมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม/การประกวดต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

- ลงพื้นที่ประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE-ของคณะกรรมการระดับประเทศ (ประเภทจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖

- ดำเนินการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

☞ **กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว** ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินการในบางกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

กิจกรรมที่ ๑ (กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓)



กิจกรรมที่ ๒



(๒.๗) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

งบประมาณ	๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๗,๒๓๐,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๑๒๐,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

เนื่องจากอาคารศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพทอผ้า เย็บผ้า ซึ่งปัจจุบันตัวอาคารมีความเก่า ชำรุดทรุดโทรม ไฟฟ้าบางส่วนใช้งานไม่ได้ รวมทั้งอาคารชั้น ๒ ถูกปล่อยทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากความชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง จึงดำเนินโครงการขึ้นเพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวแห่งนี้ ให้มีความเหมาะสม สดวกสบาย เหมาะสำหรับการใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โดยปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ติดตั้งฝ้าเพดาน (ห้องทรงงาน) , เชื่อมโครงคร่าวฝ้าเพดาน และติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๒ , งานเก็บสีสันมรยเชิงโครงคร่าวเพดาน , งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างโรงจอดรถ (ผลงานการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน แล้วเสร็จประมาณ ๖๗ %) เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๕๖,๖๑๐ บาท คงเหลือ ๕,๗๗๓,๓๙๐ บาท **กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว

👉 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 👈

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด



(๒.๘) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ

งบประมาณ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๓๙,๗๓๕,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๒๖,๕๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

เนื่องจากในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ , ๙ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน ในช่วงฤดูฝนจะประสบกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่และมีกระแสน้ำแรง กัดเซาะตลิ่ง ทำให้ทรัพย์สินของราชการและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายทุกปี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง จึงดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบและป้องกันการเกิดความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างถาวร โดยปัจจุบันผู้รับจ้างทำการปรับเกลี่ยพื้นที่โครงการช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ พร้อมปรับถมดิน เตรียมงานวางแผนเชื่อมสิ่งผลิตหล่อเสาเข็ม A, B ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ , ตัดเหล็กผูกเหล็ก แผ่นกรู , และ นำเข็มเข้าหน้างานบางส่วน เข็ม A จำนวน ๑๐๐ ต้น เข็ม B จำนวน ๑๐๐ ต้น ตอกเสาเข็มไปแล้ว เข็ม A และ B ได้ จำนวน ๑๔๐ ต้น หล่อแผ่นกรูคอนกรีตเสริมเหล็กได้ประมาณ ๓๐๐ แผ่นกรูคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผลงานการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน แล้วเสร็จประมาณ ๕๓%) **** ปัจจุบันยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ ****กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลืออมปีแล้ว

👉 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 👈

ปัญหา/อุปสรรค

- การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน (ผู้รับจ้างรับงานซ้อนกันหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถนำหักค่าประกันมาเบิกเงินในงวดที่ ๑ ได้ตามผลงานที่กำหนดในสัญญา)

ข้อเสนอแนะ

- ขอให้หน่วยงานมีการตรวจควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งกระตุ้นผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง (สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖) เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด



(๒.๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท

งบประมาณ	๔๐,๒๓๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง	๓๔,๘๐๒,๖๐๐ บาท
เงินเหลือจ่าย	๕,๔๒๗,๔๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

● แบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ●

๑. กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๒ สายทาง (สายบ้านบางแก้ว อ.ปากพะยูน, อ.บางแก้ว/สายบ้านเขาชัยสน อ.เขาชัยสน) งบประมาณ ๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๓,๙๒๔,๖๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

- ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าและติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทั้ง ๒ สายทาง

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

๒. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท จำนวน ๓ สายทาง (สายบ้านขัน อ.ศรีนครินทร์/สายบ้านคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม/สายบ้านคู อ.เมือง, อ.งขลา)/ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๑๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖)

- ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าและดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทั้ง ๓ สายทาง (สายบ้านขัน อ.ศรีนครินทร์/สายบ้านคลองใหญ่, อ.ป่าพะยอม/สายบ้านคู, อ.เมือง, อ.งขลา)

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

๓. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท อำนวยความปลอดภัยงานปรับปรุงย่านชุมชน ถนนสาย พท.๔๐๔๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๒ - บ้านสมหวัง อำเภองขลา , อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง / งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท/ลงนามสัญญาจ้าง ๙,๘๘๙,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖)

- มีการร่างประกาศ ๓ ครั้ง เนื่องจาก

ครั้งที่ ๑ มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ครั้งที่ ๒ รูปแบบรายการไม่สอดคล้องกับพื้นที่จริง

ครั้งที่ ๓ ประกาศผลผู้ชนะปรากฏว่าไม่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาขายใต้อุทธรณ์ จึงได้เชิญผู้ชนะ มาทำสัญญา

- ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว พร้อมปรับปรุงไหล่ทางแล้วเสร็จ

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

๔. กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.๗๐๕๗ แยกทางหลวงชนบท พท.๕๐๒๒ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง/ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ลงนามสัญญาจ้าง ๕,๙๙๙,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

- ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานเสาและติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ

☞ กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค (ภาพรวมทั้ง ๔ กิจกรรม)

- การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ๑

ถนนสายบ้านบางแก้ว อำเภอบางแก้ว / ถนนสายบ้านเขาชัยสน อำเภochaชัยสน



ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ๒

ถนนสายบ้านชัน อำเภอสรีนครินทร์ / สายบ้านคลองใหญ่ อำเภอบำพะยอม / สายบ้านคู อำเภอมือง / อำเภอกงหรา





ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ๓

ถนนสาย พท.๔๐๔๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๒ - บ้านสมหวัง อำเภอกงหรา / อำเภอมือง



ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ๔

ถนนสายฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อำเภอบางแก้ว

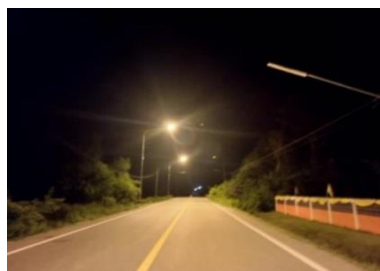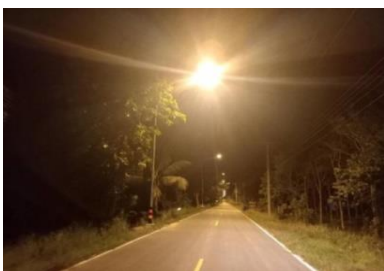

➔ ๓) โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๖๖,๙๕๔,๗๐๐ บาท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.พัทลุง) นอกรอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบให้คัดเลือกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

(๓.๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัดสวนไผ่ขวัญใจ และตลาดนัดควนขนุนสยาม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวพรุ - ยางแคะ เชื่อมโยงไปยังตลาดสวนไผ่ขวัญใจและตลาดควนขนุนสยาม

งบประมาณ	๙,๘๗๒,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๑๒,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน

เนื่องจากถนนสายหัวพรุ - ยางแคะ ตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นเส้นทางหนึ่ง ที่เชื่อมโยงไปยังตลาดสวนไผ่ขวัญใจ และตลาดนัดควนขนุนสยาม ตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยประชาชนใช้ถนนสายนี้เป็นเส้นทางในการสัญจรเมื่อเข้ามาในพื้นที่อำเภอควนขนุน ซึ่งถนนเดิมเป็นถนนดินแดง มีความชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นอุปสรรคของผู้ที่สัญจรไป - มา เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาถนนสายนี้ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรที่ไป - มา รวมทั้งเป็นการปรับทัศนียภาพของเส้นทางสายนี้ โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวพรุ - ยางแคะ ที่เชื่อมโยงไปยังตลาดสวนไผ่ขวัญใจและตลาดควนขนุนสยามแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ถนนอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

☞ โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกในบางช่วงของการก่อสร้าง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า



(๓.๒) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว ชุมชนในไร่พัฒนา ๒ ชุมชนบ้านพักครู ชุมชนสุขศาลาพัฒนา ชุมชนผดุงธรรมและชุมชนหลังสถานีรถไฟบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อและตำบลโคกสัก

งบประมาณ	๑,๖๘๔,๒๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๘๐๕,๙๕๖.๘๙ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๘๗๘,๒๔๓.๑๑ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว

เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อมีการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อยู่แล้ว จำนวน ๘ จุด ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ เทศบาลจึงดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มอีก ๑๖ จุด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรมหรือการบริหารจัดการปัญหาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่ แก่ผู้ที่สัญจรไป - มา ทั้งอำเภอบางแก้ว และอำเภอใกล้เคียง โดยเทศบาลได้ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างไปแล้ว ๓ ครั้ง แต่พบปัญหาระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ มีประชาชนประชาวิจารณ์ ๑ ราย จึงต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานใหม่
- ครั้งที่ ๒ ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างไปเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากมีผู้ที่สนใจ

แจ้งว่าไม่สามารถเปิดลิงค์ร่าง TOR ได้ เทศบาลจึงเห็นว่าอาจเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ที่สนใจรายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเปิดลิงค์ได้เช่นกัน จึงได้ยกเลิกประกาศฯ ไป เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

- ครั้งที่ ๓ เทศบาลได้ปรับราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางเดิมมีราคาสูงกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ และดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่

** ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลได้ผู้รับจ้างที่จะเข้ามาดำเนินโครงการแล้ว คือ บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด แต่เนื่องจากขณะนั้นใกล้สิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว เทศบาลจึงได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลืออมปี

** เนื่องจากบริษัทฯ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕ % (๕๒.๑๕%) เทศบาลจึงแจ้งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและหนังสือยืนยันว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศของเทศบาลได้ โดยบริษัทแจ้งว่าเหตุที่เสนอราคาต่ำเพราะมีสินค้าติดสต็อกเดิมที่เป็นต้นทุนต่ำ ได้แก่กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกและสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งเป็นสินค้าใหม่และตรงตามคุณลักษณะยี่ห้อ/รุ่นที่เสนอไป โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาทำสัญญาจ้างและจะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป **กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลืออมปีแล้ว

👉 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 👈

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

- ขอให้หน่วยงานวางแผนสำหรับการแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาการลักขโมย/กล้องมีการสูญหาย



(๓.๓) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาชัยสน

งบประมาณ	๒,๙๖๓,๙๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๒,๙๕๘,๔๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๕,๕๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน

เนื่องจากพื้นที่เดิมของพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ ได้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ก่อนแล้ว ๑ หลัง แต่เนื่องจากตัวอาคารเดิมมีความเก่าทรุดโทรม ในช่วงฤดูฝน ที่มีฝนตกหนัก จะเกิดดินสไลด์ ทำให้พื้นอาคารมีการทรุดตัว ซึ่งเทศบาลตำบลเขาชัยสนเห็นว่าปัญหาดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและครูผู้สอนได้ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ เพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กและครูผู้สอนมีพื้นที่ในการเรียนการสอน การทำกิจกรรม และจะได้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและครูผู้สอนด้วย

☞ โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากมีการรับงานพร้อมกันหลายที่
- ๒) ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงดงานที่กำหนด
- ๓) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ



(๓.๔) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำพญาไธสง โดยติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียว พร้อมติดตั้งเสากิ่งเดียวตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๕๕ ชุด

งบประมาณ	๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๓,๘๕๖,๑๕๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ / สิ้นสุดวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๓,๘๕๐ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา

เนื่องจากถนนสายชะรัด - ไร่เหนือ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นเส้นทางหนึ่งที่ใช้ ในการคมนาคมขนส่งและเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชน แต่จากปัญหาการสัญจร ที่ไม่สะดวกและไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ อาชญากรรมในพื้นที่ได้ เทศบาลตำบลชะรัดจึงดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕๕ ชุด ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด , หมู่ที่ ๖ บ้านนามะพร้าว , หมู่ที่ ๘ บ้านหูลู่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่สัญจรไป - มา รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน ปัจจุบันติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ จำนวน ๕๕ ชุด แล้วเสร็จ ถนนสายนี้ มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้สัญจรไป - มา มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☜

ปัญหา/อุปสรรค

- ในช่วงเริ่มแรกของการดำเนินโครงการฯ ได้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จากปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ จึงทำให้ ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะพื้นลงเสาไฟฟ้าล่าช้า



(๓.๕) โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตบอล บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓

งบประมาณ	๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๒๕๓,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์

เนื่องจากพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ตำบลหนึ่งที่เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน แต่เดิมในพื้นที่ไม่มีสถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย ทำให้ต้องไปใช้สถานที่อื่นๆ ซึ่งในบางสถานที่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับประเภทกีฬา และในบางครั้งจะต้องไปขอใช้สถานที่จากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สถานที่ได้ทุกๆ ครั้ง เทศบาลตำบลอ่างทอง จึงเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างลานกีฬา ลานออกกำลังกาย เพื่ออำนวยความสะดวก และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ รวมถึงช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตบอลแล้วเสร็จ ปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาใช้เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อน/เล่นกีฬา/ออกกำลังกาย เป็นจำนวนมาก

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☜

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างมีการสลับสับเปลี่ยนผู้รับจ้างด้วยตนเอง ทำให้เริ่มเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน



(๓.๖) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงกีฬาสายเลียบคันคลองแหลมโตนต (ด้านขวา) โดยก่อสร้างเส้นทางจักรยาน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง

งบประมาณ	๘,๙๘๔,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๘,๙๗๘,๘๘๘ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๕,๑๑๒ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลแหลมโตนต อำเภอควนขนุน

เนื่องจากเส้นทางสายเลียบคันคลองแหลมโตนตแห่งนี้ เป็นเส้นทางหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมโตนต อำเภอควนขนุน ที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการประกอบอาชีพ (ขนส่งผลผลิต/สินค้าทางการเกษตร) ซึ่งเดิมเส้นทางสายนี้เป็นถนนดินแดง มีความลาดชัน ช่วงฝนตกจะเกิดดินสไลด์ ทำให้เป็นอันตรายกับผู้สัญจรไป - มา เทศบาลตำบลแหลมโตนต จึงดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้สัญจรไป - มา และช่วยให้เกิดความสะดวกรบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณ ๒ ข้างทางเลียบคันคลองแล้วเสร็จ ประชาชนผู้สัญจรไป - มา มีความสะดวกรบายมากยิ่งขึ้น

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☜

ปัญหา/อุปสรรค

๑) พื้นที่ดำเนินงานมีความลาดชัน ในช่วงที่มีฝนตก มีการเกิดดินสไลด์ ผู้รับจ้างจึงดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์ได้อีกในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานมีการเสนอโครงการเพื่อปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินสไลด์ และคาดว่าจะดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกได้ในปีงบประมาณถัดไป

๒) การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายได้ตามปริมาณงานในสัญญาแต่ละงวด (คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายพร้อมกันทั้ง ๒ งวด)

ข้อเสนอแนะ

- เสนอให้หน่วยงานมีการเสนอของบประมาณ (ในปีงบประมาณถัดไป) เพื่อจัดทำราวป้องกันอันตรายบริเวณถนนเลียบคันคลองตลอดเส้นทาง



(๓.๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.- สายโหล๊ะมุดสัง - ไสขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร

งบประมาณ	๖,๖๐๑,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๑,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม

เส้นทางสายโหล๊ะมุดสัง - ไสขาม เป็นเส้นทางหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม ที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป - มา ซึ่งเดิมเป็นถนนดินแดง ช่วงฝนตกจะเกิดดินโคลน ซึ่งทำให้อาจเป็นอันตรายกับผู้สัญจรไป - มา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงดำเนินโครงการนี้เพื่อช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้สัญจรไป - มา และช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะมุดสัง - ไสขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า และดำเนินการถมไหล่ทางแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว☞

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาสัญญาจ้าง แต่ผู้รับจ้างไม่ได้ส่งมอบงานตามงวดงาน ทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า



(๓.๘) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานยาง - ปลายห้วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท

ลงนามในสัญญาจ้าง ๘,๔๕๘,๐๐๐ บาท

(เริ่มต้นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ / สิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

เงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต

เนื่องจากพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ เป็นเส้นทางหนึ่งที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ซึ่งเป็นแปลงสาธิตทางการเกษตรฯ ซึ่งเดิม การเดินทางยังไม่มีความสะดวกสบาย ถนนเป็นถนนลูกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จึงดำเนินโครงการนี้ เพื่อต้องการพัฒนาปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว ให้มีการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นทาง และเทคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานยาง - ปลายห้วย หมู่ที่ ๒ แล้วเสร็จ

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว☞

ปัญหา/อุปสรรค

๑) การดำเนินงานในงวดที่ ๒ มีความล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างมีการรับงานซ้อนกันหลายที่/อุปกรณ์ที่ใช้ ไม่เพียงพอเพราะต้องสลับกันใช้กับงานที่อื่น ทำให้ปริมาณงานในงวดที่ ๒ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และทำให้การเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๒ มีความความล่าช้า

๒) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ



(๓.๙) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลแม่ขี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ	๔,๔๑๘,๖๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๓,๙๙๖,๔๕๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๔๒๒,๑๕๐ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลแม่ขี อำเภอดงหลวง

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ขี อำเภอดงหลวง มีการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินการทุกด้านของเทศบาลฯ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ แต่ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ เทศบาลจึงเห็นว่าควรดำเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อจอแสดงภาพ (LED Display) ที่สามารถทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลแม่ขีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ - มา ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจอป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวยังประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า มากกว่ารูปแบบของป้ายไวเนล โดยเทศบาลได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ไปแล้ว ดังนี้

- รอบที่ ๑ ได้ผู้รับจ้างที่จะดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่พบปัญหาความผิดพลาดในการดำเนินการขอใช้พื้นที่ติดตั้งป้ายจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง จึงต้องชะลอการทำสัญญาจ้างไว้ ซึ่งเทศบาลดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจและขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งแต่ได้รับการยืนยันว่าไม่สามารถติดตั้งได้

- รอบที่ ๒ เทศบาลดำเนินการประสานขอใช้พื้นที่ใหม่ในการติดตั้งป้าย คือ พื้นที่บริเวณด้านหน้าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง (ติดกับโรงเรียนบ้านแม่ขี ต.แม่ขี อ.ดงหลวง จ.พัทลุง) โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว **กั้นเงินไว้เบิกจ่ายหลัอมปีแล้ว

** ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตอกเสาเข็มฐานจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
๒. งานวางสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. งานห้องควบคุม

☞ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☜

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินการมีความล่าช้า เนื่องจากพบปัญหาความผิดพลาดในการดำเนินการขอใช้พื้นที่ติดตั้งป้ายจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง



(๓.๑๐) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรอบเมืองเก่าชัยบุรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๒๒๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๘,๐๕๔,๐๐๐ บาท

ลงนามในสัญญาจ้าง ๘,๐๔๘,๗๘๙ บาท

(เริ่มต้นวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ / สิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

เงินเหลือจ่าย ๕,๒๑๑ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง

เนื่องจากถนนสายรอบเมืองเก่าชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นถนนเส้นทางหนึ่ง ที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม บริเวณรอบเมืองเก่าชัยบุรี ซึ่งถนนเดิมมีความชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดความลำบาก และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไป - มา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีชัยบุรี จึงดำเนินโครงการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรอบเมืองเก่าชัยบุรีแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสายนี้ในการสัญจรไป - มา ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☜

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -



(๓.๑๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอสส์ และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔.๖๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ	๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	- สัญญาเดิม ๗,๘๑๕,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ / สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ** ปรับลดค่างานเสาเข็มงวดที่ ๒ = ๑๘๘,๑๗๑.๓๖ บาท - สัญญาใหม่ ๗,๖๒๖,๘๒๘.๖๓๖ บาท
เงินเหลือจ่าย	๑๙๓,๑๗๑.๓๖ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน

เนื่องจากในพื้นที่ตำบลปากพะยูน ได้มีท่าเทียบเรือเดิมอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่องจากท่าเทียบเรือหลังเก่าได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้อาคารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดทรุดโทรม และอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งานเทศบาลตำบลปากพะยูนจึงเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องก่อสร้างศาลาท่าเทียบเรือหลังใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและลานอเนกประสงค์ และเนื่องจากผู้รับจ้างได้ลงนามสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา ๓๐๐ วัน (สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูน จึงได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว

- ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและลานอเนกประสงค์ (ผลงานการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน แล้วเสร็จประมาณ ๓๙ %) โดยผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๖๘๗,๔๒๘.๓๖ บาท คงเหลือ ๕,๙๓๙,๔๐๐ บาท **กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว

☞ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เข้ามายื่นซองมาในรอบแรก ทำให้ต้องประกาศยกเลิกและดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ รอบที่ ๒



(๓.๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป - เต่าถ่าน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๓๑๐๐๓ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองธง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๔๑๐ ตารางเมตร

งบประมาณ	๖,๐๗๐,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๖,๐๕๘,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ / สิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖)
เงินเหลือจ่าย	๑๒,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	เทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน

เนื่องจากถนนสายเทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป - เต่าถ่าน) เป็นเส้นทางหนึ่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป - มา แต่เนื่องจากถนนมีความชำรุดเป็นช่วงๆ ก่อให้เกิด ความลำบาก/เป็นอุปสรรคในการสัญจร และเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่สัญจรไป - มา ในบางครั้ง เทศบาลตำบลป่าบอน จึงเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป - มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางมากขึ้น ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป-เต่าถ่าน) แล้วเสร็จ ผู้สัญจรไป - มา บนถนนสายนี้ เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว☞

ปัญหา/อุปสรรค

- สภาพฝนฟ้าอากาศมีฝนตกในบางช่วงของการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เสนอให้ทำราวป้องกันอันตรายบริเวณทางโค้ง หรือตลอดเส้นทางถนน เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่ไม่ชำนาญในเส้นทาง
- ๒) เสนอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบนเส้นทาง เนื่องจากถนนมีความคดโค้งตลอดสาย จึงอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไป - มา ในช่วงเวลากลางคืนได้



๕๔) โครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ / ติดตามซ้ำ)

➤ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนพพร บุญแก้ว)

(๕.๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์

งบประมาณ	๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาจ้าง	๒๐,๙๘๙,๐๐๐ บาท (เริ่มต้นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ / สิ้นสุดวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕)
เงินเหลือจ่าย	๑๑,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

ด้วยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินโครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ โดยในช่วงฤดูฝนจะเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร เส้นทางสัญจรและกระแสไฟฟ้าแรง เกิดการกัดเซาะตลิ่ง ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าวทุกปี และเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดพัทลุงจึงได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ เพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะของน้ำบริเวณดังกล่าวได้อย่างถาวร

☞โครงการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ☞

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ในบางช่วง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า



ส่วนที่ ๔

ปัญหา/ อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม



ส่วนที่ ๔ ปัญหา/ อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ (มีฝนตกเป็นระยะ) ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด


- ปัญหาผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ แต่ไม่ส่งมอบงานตามงวดงาน ทำให้การเบิกจ่ายประมาณมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง

- ปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน

- ปัญหาผู้รับจ้างรับงานซ้อนกันหลายที่ ทำให้งานมีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างมีจำนวนคนงาน/เครื่องมือ - อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการทำงาน

ส่วนที่ ๕

ภาคผนวก

 ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก



สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งนายนพพร บุญแก้ว (ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง) ได้มอบหมายให้ นายสมพงศ์ เขียวหอม (กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมฯ



วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกาญจนา ผอมดำ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงาน ปปท. เขต ๙ และศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๗๑-๐๑๕ สายน้ำตก - เกาะกลม หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
